



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

---

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK  
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA  
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

**Izveštaj o  
napretku**

**Za 2012. godinu**

**Program za sprovođenje Strategije za  
rudarstvo 2012-2014**

Februar, 2013

## SADRŽAJ

---

SKRAĆENICE .....	3
UVOD .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
METODOLOGIJA ZA PRIPREMU IZVEŠTAJA O NAPRETKU .....	5
PRVI STUB .....	6
DRUGI STUB .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
TREĆI STUB .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
ČETVRTI STUB .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
RELEVANTNI PROJEKTI.....	21
POKAZATELJI UČINKA .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>



## SKRAĆENICE

---

MER	Ministarstvo ekonomskog razvoja
OPEREI	Odeljenje za politike ekonomskog razvoja i evropske integracije
OER	Odeljenje za energetiku i rudarstvo
GIK	Geološki institut Kosova
KAP	Kosovska agencija za privatizaciju
INKOS	Institut, Inkos a.d.
MŽSPP	Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
KEK	Kosovska energetska korporacija
NKRM	Nezavisna komisija za rudnike i minerale
TE	Termoelektrana
SR	Strategija za rudarstvo Republike Kosovo, 2012-2025
PSSR	Program za sprovođenje Strategije za rudarstvo, 2012-2014
JZS	Jugozapadni Sibovac
BK	Budžet Kosova
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative (Inicijativa za transparentnost ekstraktivnih industrija)
DP	Divizija za proizvodnju



## UVOD

---

Izveštaj o napretku za 2012. godinu opisuje napredak u realizaciji projekata, odnosno aktivnosti, predviđenih u PSSR 2012-2014.

Izveštaj, takođe, nastoji da identifikuje projekte i druge aktivnosti realizovane u rudarskom sektoru koje su bile deo planiranja u PSSR 2012-2014.

Ovaj izveštaj identifikuje ostvareni napredak i identifikuje izazove za nerealizaciju određenih projekata/aktivnosti.

Identifikacija izazova će pomoći da se olakša rad u rešavanju problema koji se mogu smatrati preprekama za dalji razvoj sektora, a to će pomoći u pravcu unapređenja planiranja, realizacije i temeljnije analize u pogledu planiranja troškova i vremena realizacije projekata.

Shodno tome, godišnji izveštaj o napretku će poslužiti i kao osnova za preispitivanje politika za razvoj rudarstva koje se mogu odraziti na preispitivanje Strategije za rudarstvo.



## METODOLOGIJA ZA PRIPREMU IZVEŠTAJA O NAPRETKU

---

Izveštaj o napretku za 2012. godinu u vezi sa Programom za sprovođenje Strategije za rudarstvo 2012-2014 (IN za 2012 o PSSR 2012-2014), pripremljen je u skladu sa Zakonom o rudnicima i mineralima br. 03/L-163, Strategijom za rudarstvo Republike Kosovo 2012-2025 i PSSR 2012-2014.

MER-OPEREI je koordinirao proces izrade izveštaja o napretku, a u izradi ovog dokumenta učestvovala su relevantne institucije u rudarskom sektoru, i to: MER-OER, MER-GIK, KEK, Trepča-KAP, NKRM, MŽSPP i INKOS a.d.

Na početku, OPEREI je izradio model izveštavanja putem tabela/pregleda, u kojima su prikazani projekti predviđeni u PSSR za 2012. godinu. Takođe, OPEREI je predsedavao i radnim sastancima sa navedenim institucijama. Na prvom (i) sastanku diskutovano se o formi i načinu izveštavanja, dok se na drugom (ii) sastanku diskutovano o napretku svakog projekta za 2012. godinu predstavljenog u PSSR-u za 2012. godinu. Pored toga, OPEREI je po potrebi kontaktirao nadležne institucije i diskutovao o određenim pitanjima.

U nastavku su prikazane tabele sa nazivima projekata/aktivnosti iz PSSR 2012-2014, praćene kolonom o realizovanosti (procenat realizacije) i kolonom sa komentarima.



SHTYLLA E PARË

Stvaranje povoljnih uslova za ekonomsku valorizaciju mineralnih resursa i privlačenje investicija						
Br.	Projekat/aktivnost predviđena u 2012. godini	Pokazatelj (SR)	Odgovorna institucija	Troškovi u € za 2012. godinu i izvor finansiranja	Postignuti rezultati	Komentari
<b>Cilj 1. Dopuna zakonske i regulatorne infrastrukture</b>						
1	Razmatranje Zakona 03/L-163 o rudnicima i mineralima	St. I Cilj 1. Izrada Zakona o rudarstvu	Skupština Kosova, Vlada i MER	Nema troškova	Usvojen je u načelu u Skupštini Republike Kosovo. <b>Realizacija: 75%</b>	Očekuje se konačno usvajanje od strane Skupštine Republike Kosovo
<b>Cilj 2. Izrada politika za razvoj rudarskog sektora</b>						
1	Učlanjenje Kosova u EITI	St. I, Cilj 2, Mera I.2.5	MER	5.000 BK	Izvršena je analiza kriterijuma i pravila, koji se moraju ispuniti tokom procesa učlanjenja.	Troškovi koji su predviđeni za ovu aktivnost u 2012. godini nisu

					Realizacija: 15%	iskorišćeni.
2	Otvaranje novih radilišta na Horizontima X i XI u rudniku Stari Trg	St. I, Cilj 2, Mera I.2.3	Trepča	930.000 BK	Otvorena su nova radilišta predviđena projektom. Realizacija: 100%	
3	Rehabilitacija radilišta na Horizontima VIII i IX u rudniku Stari Trg	St. I, Cilj 2, Mera I.2.3	Trepča	1.000.000 BK	Izvršena je nabavka mašine za eksploataciju i drugih materijala za rehabilitaciju radilišta, kao što je predviđeno projektom  Realizacija: 100%	
4	Dopunski rudarski projekat za površinsku eksploataciju rude nikla u rudniku Glavica Magura – Lipljan	St. I, Cilj 2, Mera I.2.3.	Newco Ferronikeli Complex L.L.C.  NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđivanje metoda i načina eksploatacije;</li> <li>• Dokumentovanje načina eksploatacije;</li> <li>• Red i veća bezbednost prilikom eksploatacije rudnika;</li> <li>• Pripremljen je plan rudarskih radova za dve godine, 2012-2013</li> </ul> Realizacija: 100%	
5	Dopunski rudarski projekat za površinsku eksploataciju rude nikla u rudniku Čikatovo – Glogovac	St. I, Cilj 2, Mera I.2.3.	Newco Ferronikeli Complex L.L.C.  NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđivanje metoda i načina eksploatacije;</li> <li>• Dokumentovanje načina eksploatacije;</li> <li>• Red i veća bezbednost</li> </ul>	

					prilikom eksploatacije rudnika; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripremljen je plan rudarskih radova za period 2012 -2013.</li> </ul> Realizacija: 100%	
6	Projekat eksploatacije targeta hroma Briu i Gjeletocit (karijera), Lapčevo (SO Orahovac)	St. I, Cilj 2, Mera I.2.3.	Arsi d.o.o. NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđivanje metoda i načina eksploatacije;</li> <li>• Dokumentovanje načina eksploatacije;</li> <li>• Red i veća bezbednost prilikom eksploatacije rudnika;</li> <li>• Pripremljen je plan rudarskih radova za period 2012 -2013.</li> </ul> Realizacija: 100%	
7	Dopunski srednjoročni plan za period 2013-2017 za rudnik JZS	St. I, Cilj 2, Mera I.2.3.	INKOS a.d.	44.500 KEK	Izrađen je srednjoročni plan za snabdevanje ugljem za period 2013-2017 na zahtev KEK-a Realizacija: 100%	
8	Projektovanje odlagališta deponije pepela iz TE Kosovo B	St. I, Cilj 2.	INKOS a.d.	11.600 KEK	Projekat nije realizovan. Očekuje se da će ovaj projekat biti realizovan u 2013. godini Realizacija: 0%	Nedostatak finansijskih sredstava
9	Geološko-mehanička	St. I,	INKOS a.d.	33.000	Identifikovane su padine sa	



	istraživanja u rudniku JZS	Cilj 2.		KEK	velikim nagibom što će omogućiti otklanjanje rizika tokom eksploatacije uglja. Realizacija: 100%	
10*	Popravka sistema transportnih traka za lignit B-1600 mm (3 km) (nastavak projekta iz 2011) i popravka traka za jalovinu	St. I, Cilj 2.	KEK	3.990.000 KEK	Povećanje efikasnosti i sigurnosti u snabdevanju ugljem. Projekat je završen. Realizacija: 100%	Ukupni troškovi: 52.940.000€
11*	Popravka bagera: (E 5M) i (E 7M), (E10M, Jalovina) i samohodnih traka (nastavak projekta iz 2011. godine)	St. I, Cilj 2.	KEK	360.000 KEK	Kompletiranje projekta JZS i povećanje proizvodnih kapaciteta Realizacija: 100%	Ukupni troškovi: 22.180.000€
12*	Popravka odlagača (P4M) – Jalovina	St. I, Cilj 2.	KEK	600.000 KEK	Kompletiranje projekta JZS i povećanje proizvodnih kapaciteta Realizacija: 100%	Ukupni troškovi: 11.360.000 €
13*	Nabavka i montaža Teleskopske stanice. (Stanice za pražnjenje na dve ili više traka tokom procesa proizvodnje uglja)	St. I, Cilj 2.	KEK	4.160.000 KEK	Kompletiranje projekta JZS i povećanje proizvodnih kapaciteta Realizacija: 100%	Ukupni troškovi: 4.930.000 €

\*Projekti koji nisu uvršteni u PSSR (2012-2014). Ovi projekti su počeli u toku perioda 2010-2011, a završeni su u 2012. godini.

Ovo su projekti koje je predstavio KEK-DPU, a u skladu su sa merama i razvojnim politikama predviđenim SR, odnosno u Stubu I Cilj 2 SR.

### Cilj 3. Razvoj fiskalnih politika

						U vremenskom periodu 2012 – 2014 nije planirana nikakva aktivnost u vezi sa ovim ciljem
<b>Cilj 4. Realizacija ekonomske valorizacije rudarskog potencijala</b>						
1	Studija izvodljivosti za Dukađinski ugljunosni basen	St. I, Cilj 4, Mera I.4.3	MER	82.500 BK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđeno je polje prostiranja uglja;</li> <li>• Identifikovana su polja i model eksploatacije uglja;</li> <li>• Izabrano je polje za otvaranje novog rudnika za eksploataciju uglja, koje ima povoljne geološko-rudarske uslove infrastrukture.</li> </ul>	Projekat je imao dodatne troškove u odnosu na one planirane, od: 5,575 € -(6.76%) Konačni troškovi: 88,075 € , iz BK
					Realizacija: 100%	
2	Studija izvodljivosti za Drenički ugljunosni basen	St. I, Cilj 4, Mera I.4.3.	MER	49.500,58 BK	Studija je prikupila, analizirala i predstavila podatke i informacije o geološko-rudarskim uslovima za polja prostiranja uglja, identifikovane su geološke rezerve, izabrano je polje za otvaranje novog rudnika za eksploataciju.	
					Realizacija: 100%	

3	Geološki elaborat o rezervama i kvalitetu laporca na lokalitetu Dimce-Elez Han	St. I, Cilj 4.	Sharrcem d.o.o. NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđivanje iskoristivih rezervi ležišta;</li> <li>• Dokumentovanje rezervi ležišta.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Realizacija: 100%</div>	Izveštaji o stanju rezervi posle svake kalendarske godine NKRM
4	Glavni projekat eksploatacije laporca iz ležišta Dimce-Elez Han	St. I, Cilj 4.	Sharrcem d.o.o. NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentovanje načina eksploatacije;</li> <li>• Povećanje nivoa bezbednosti tokom eksploatacije rudnika.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Realizacija: 100%</div>	Izveštaji o dinamici eksploatacije u korelaciji sa planiranjem godišnje proizvodnje prema prihvaćenom programu eksploatacije
5	Geološki elaborat o izračunavanju rezervi nikla na ležištu Glavica – Lipljan	St. I, Cilj 4.	Newco Ferronikeli Complex L.L.C. NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđivanje iskoristivih rezervi ležišta;</li> <li>• Dokumentovanje i kategorizacija rezervi ležišta.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Realizacija: 100%</div>	Izveštaji o stanju rezervi posle svake kalendarske godine

6	Geološki elaborat o izračunavanju rezervi nikla na ležištu Čikatovo – Glogovac	St. I, Cilj 4.	Newco Ferronikeli Complex L.L.C. NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđivanje iskoristivih rezervi ležišta;</li> <li>• Dokumentovanje i kategorizacija rezervi ležišta.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; background-color: #92d050; padding: 2px; text-align: center;">Realizacija: 100%</div>	Izveštaji o stanju rezervi posle svake kalendarske godine
7	Geološki izveštaj sa obračunima rezervi hroma targeta Briu i Gjelocit (Karijera), SO Orahovac	St. I, Cilj 4.	“Arsi” d.o.o. NKRM	Nema troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvrđivanje iskoristivih rezervi ležišta;</li> <li>• Dokumentovanje i kategorizacija rezervi ležišta.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; background-color: #92d050; padding: 2px; text-align: center;">Realizacija: 100%</div>	Izveštaji o stanju rezervi posle svake kalendarske godine
8	Ležišta i pojave mineralizacija Pb-Zn-Cu za celu teritoriju Kosova	St. I, Cilj 4.	MER	Nema troškova	<p>Uspostavljena je baza podataka o ležištima i pojavama mineralizacija Pb-Zn-Cu za celu teritoriju Kosova koja sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokaciju;</li> <li>- Geološki opis za navedene pojave;</li> <li>- Nivo istraživanja;</li> <li>- Rezerve;</li> <li>- Laboratorijske analize;</li> <li>- Bušenja, itd.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; background-color: #92d050; padding: 2px; text-align: center;">Realizacija: 100%</div>	Projekat je realizovalo osoblje GIK-a

9	Ležišta i pojave mineralizacija industrijskih minerala (bentoniti i kvarc) za celu teritoriju Kosova	Stub I, Cilj 4.	MER	Nema troškova	<p>Uspostavljena je baza podataka o ležištima i pojavama mineralizacija industrijskih minerala (bentoniti i kvarc) za celu teritoriju Kosova, koja sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokaciju;</li> <li>- Geološki opis za navedene pojave;</li> <li>- Nivo istraživanja;</li> <li>- Rezerve;</li> <li>- Laboratorijske analize;</li> <li>- Bušenja, itd.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Realizacija: 100%</p>	Projekat je realizovalo osoblje GIK-a
---	--	-----------------	-----	---------------	--	---------------------------------------

DRUGI STUB

Povećanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta u oblasti rudarskog sektora						
Br.	Projekat/aktivnost predviđena u 2012. godini	Pokazatelj (SR)	Odgovorna institucija	Troškovi u € za 2012. godinu i izvor finansiranja	Postignuti rezultati	Komentari
Cilj 1. Institucionalni razvoj i razvoj ljudskih kapaciteta						
1	Obuka osoblja za korišćenje softvera Auto Cad Civil 3D.	St. II, Cilj 1.	NKRM	10.000 BK	Obavljena je obuka osoblja za korišćenje programa Auto Cad Civil 3D. <b>Realizacija : 100%</b>	
2	Realizacija studije o mogućnosti uvođenja INKOS-a kao institucije u okvir GIK-a	St. II, Cilj 1, Mera II.2.2 II.2.3 II.2.4	INKOS a.d.	Nema troškova	Realizacija studije je u završnoj fazi. <b>Realizacija: 80%</b>	Vodili su se razgovori i angažovanja za realizaciju ovog plana

		II.2.5 II.2.6 i II.2.7				
<b>Cilj 2. Istraživanje mineralnih resursa i izveštavanje o njima</b>						
1	Uspostavljanje elektronske arhive GIK-a	St. II, Cilj 2.	MER	-	Nastavljeno je popunjavanje arhive GIK-a geološkim podacima. <b>Realizacija : 100%</b>	Ova aktivnost će se nastaviti i u narednim godinama
2	Plan upravljanja mineralnim resursima Kosova	St. II, Cilj 2. Mera II.1.6	NKRM	200.000 BK	<b>Realizacija: 0%</b>	Projekat nije realizovan zbog prenamene finansijskih sredstava
3	Godišnji plan upravljanja mineralnim resursima Kosova	St. II, Cilj 2, Mera II.1.6 Zakon br. 03/L-163 o rudnicima i mineralima, član 74.	NKRM	Nema troškova	<b>Realizacija: 0%</b>	
4	Izrada dve planšete 1:25000 K34-54Bb i K34-54Bd.	St. II, Cilj 2.	NKRM	80.000 BK	Geološke informacije dobijene kartografijom u srazmeri 1:25000	

					Realizacija: 100%	
5	Elaborat geoloških rezervi boksita na ležištu br. 39 Dresnik – Dolac	St. II, Cilj 2, Mera II.1.1	Kosovski boksiti  NKRM	-	Izrada geološkog elaborata rezervi  Realizacija: 100%	



TREĆI STUB

Socijalna pitanja i koristi za zajednicu						
Br.	Projekat/aktivnost predviđena u 2012. godini	Pokazatelj (SR)	Odgovorna institucija	Troškovi u € za 2012. godinu i izvor finansiranja	Postignuti rezultati	Komentari
Cilj 1. Rešavanje socijalnih pitanja i bezbednost na radu						
1	Podrška socijalnih šema (penzija) za Industrijski kompleks Trepča	St. III, Cilj 1, Mera III.1.1.	MER	3.082.870 BK	Realizovani su svi fondovi predviđeni za održavanje socijalnih šema Rudarskog kompleksa Trepča Realizacija: 100%	
Cilj 2. Učešće i koristi za zajednice						
1						Nije predviđen nijedan projekat/aktivnost u PSSR 2012-2014

ČETVRTI STUB

Briga za životnu sredinu						
Br.	Projekat/aktivnost predviđena u 2012. godini	Pokazatelj (SR)	Odgovorna institucija	Troškovi u € za 2012. godinu i izvor finansiranja	Postignuti rezultati	Komentari
Cilj 1. Rešavanje istorijskih problema životne sredine						
1	Rehabilitacija degradiranih područja reke Beli Drim	St. IV, Cilj 1, Mera VI.1.4.	MŽSPP	3.000.000 (70% donatori i 30% BK)	Nema rezultata. Realizacija projekta nije počela. Realizacija: 0%	Nedostatak finansijskih sredstava
2	Rehabilitacija napuštenih iskorišćenih područja (kamenoloma)	St. IV, Cilj 1, Mera VI.1.4.	MŽSPP	500.000 (70% donatori i 30% BK)	Nema rezultata. Realizacija projekta nije počela. Realizacija: 0%	Nedostatak finansijskih sredstava
3	Rehabilitacija iskorišćenih rudarskih područja (istorijskih)	St. IV, Cilj 1, Mera VI.1.4.	MŽSPP	1.000.000 (70% donatori 10% BK, 20% Trepča)	Nema rezultata. Realizacija projekta nije počela. Realizacija: 0%	Nedostatak finansijskih sredstava
4	Tretiranje kiselih voda u rudnicima	St. IV, Cilj 1, Mera VI.1.4.	MŽSPP	200.000 (70% donatori i 30% BK)	Nema rezultata. Realizacija projekta nije počela. Realizacija: 0%	Nedostatak finansijskih sredstava

5	Rehabilitacija industrijskog parka u Mitrovici	St. IV, Cilj 1, Mera IV.1.1., IV.1.2., IV.1.3., VI.1.4. i VI.1.5.	Trepča	500.000 (Donatori, Trepča-KAP Opština Mitrovica, MŽSPP)	Nema rezultata Realizacija: 0%	Održana je donatorska konferencija i obavljeno je dizajniranje projekta u koji je uvrštena i rehabilitacija dela koji obuhvata severni deo. Sredstva su do sada obezbedili jedino Trepča i MŽSPP.
6	Tretiranje kiselih voda u rudniku Novo Brdo	St. IV, Cilj 1, Mera IV.1.1., IV.1.2., IV.1.3., VI.1.4. i VI.1.5.	Trepča	100.000 (Donatori, Trepča-KAP, MŽSPP)	Nema rezultata Realizacija: 0%	Nedostatak finansijskih sredstava
7	Druga faza rehabilitacije/pokrivanja deponije u selu Kelmend	St. IV, Cilj 1, Mera IV.1.1., IV.1.2., IV.1.3., VI.1.4. i VI.1.5.	Trepča	100.000 Donator	Nema rezultata. Realizacija: 0%	Nedostatak finansijskih sredstava
8	Izrada projekta za rekultivaciju unutrašnjih i	St. IV, Cilj 1, Mera	KEK	22.000 KEK	Nema rezultata.	Nedostatak finansijskih

	spoljašnjih odlagališta i deponija pepela u M.S. „Kosovo“	VI.1.4.				Realizacija: 0%	sredstava
9	Geomehanička istraživanja deponije/odlagališta u Belačevcu	St. IV, Cilj 1.	INKOS a.d.	44.000 KEK		Nema rezultata. Realizacija: 0%	Ovaj projekat je odložen za kasnije, očekuje se da će biti realizovan u junu 2013. godine.
<b>Cilj 2. Zaštita životne sredine od rudarskih aktivnosti</b>							
1	Monitoring životne sredine DPU	St. VI, Cilj 2.	INKOS a.d.	50.000 KEK	Sproveden je monitoring voda, zemljišta i vazduha u područjima KEK-a i identifikovani su glavni zagađivači u tim područjima, u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine u tim područjima	Realizacija: 100%	
2	Monitoring životne sredine DP (TE Kosovo A i TE Kosovo B)	St. VI, Cilj 2.	INKOS a.d.	70.000 KEK	Sproveden je monitoring životne sredine u vezi sa imisijom i emisijom u TE Kosovo A i TE Kosovo B	Realizacija: 100%	

## RELEVANTNI PROJEKTI<sup>1</sup>

Ostali relevantni projekti za rudarski sektor						
Br.	Projekt/aktivnost predviđena u 2012. godini	Pokazatelj (SR)	Odgovorna institucija	Troškovi u € za 2012. godinu i izvor finansiranja	Postignuti rezultati	Komentari
1	Seizmičko mikrozoniranje Gnjilana	-	MER	104.626 BK	<p>Realizovana je studija seizmičkog mikrozoniranja za 60 hektara površine u opštini Gnjilane. Dobijeni su seizmički parametri za navedenu površinu. Izrađena je seizmička karta za te parcele.</p> <div style="background-color: #d9ead3; padding: 2px; text-align: center;">                     Realizacija: 100%                 </div>	Ukupni troškovi: 155.000 € BK

<sup>1</sup> Ovo su projekti koji su prikazani u PSSR-u 2012-2014, a koji nemaju jasne pokazatelje u Strategiji za rudarstvo.

## POKAZATELJI UČINKA


U donjoj tabeli prikazani su procenti realizovanosti PSSR-a za 2012. godinu.

Projekti/Aktivnosti prikazani u PSSR-u	Broj projekata/aktivnosti	Realizacija u procentima
<b>Prvi (I) stub</b> <b>(Stvaranje povoljnih uslova za ekonomsku valorizaciju mineralnih resursa i privlačenje investicija)</b>	<b>19</b>	<b>73%</b>
<b>Drugi (II) stub</b> <b>(Povećanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta u oblasti rudarskog sektora)</b>	<b>7</b>	<b>69%</b>
<b>Treći (III) stub</b> <b>(Socijalna pitanja i koristi za zajednicu)</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
<b>Četvrti (IV) stub</b> <b>(Briga za životnu sredinu)</b>	<b>11</b>	<b>18%</b>
<b>Relevantni projekti</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
<b>Ukupna realizacija projekata/aktivnosti PSSR-a za 2012. godinu</b>	<b>39</b>	<b>69.07%</b>

**Napomena:** KEK je realizovao 4 projekta (popravka i nabavka opreme za eksploataciju uglja (videti Stub I, Cilj 2, projekti: 10, 11, 12 i 13) koji nisu bili predstavljeni u dokumentu PSSR 2012-2014. Ipak, projekti su u skladu sa merama i razvojnim politikama predviđenim SR, tačnije Ciljem 2 Stuba I SR.

Budući da su projekti o kojima je izvestio KEK realizovani 100%, njihovo uključivanje u ukupnu realizaciju projekata/aktivnosti PSSR-a za 2012. godinu daje pravi pokazatelj realizacije PSSR-a za 2012. godinu na nivou od **69.07%**.

Grafikon – Pokazatelj učinka u procentima (%) na osnovu realizacije projekata/aktivnosti prema instituciji\*\* :

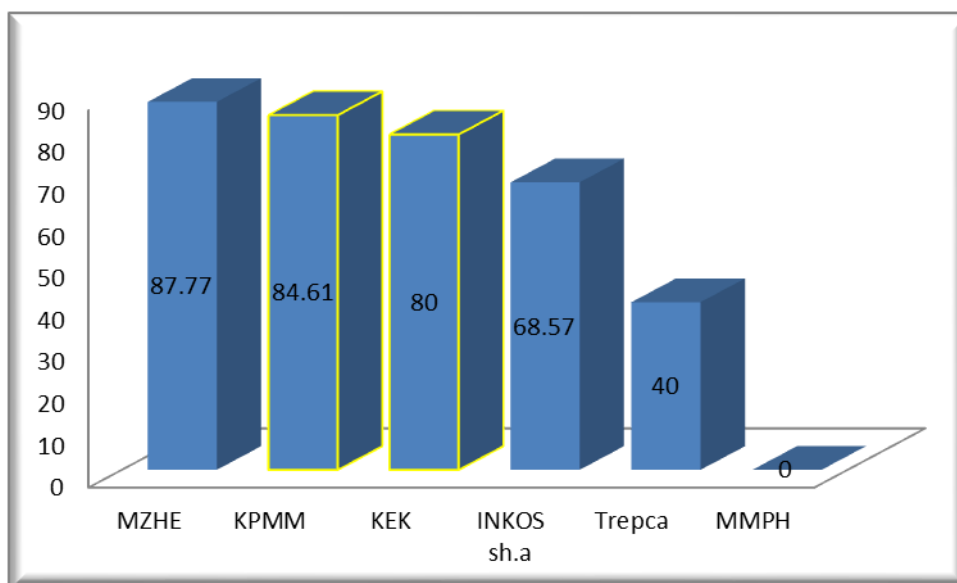

\*\* Učinak KEK-a za 2012. godinu obuhvata i 4 projekta koji nisu predstavljeni u PSSR-u, a koje je realizovao u 2012. godini (videti Stub I, Cilj 2, projekti 10, 11, 12 i 13).

\*\* Učinak NKRM je predstavljen zajedno sa učinkom preduzeća - Newco Ferronikel Complex, L.L.C, Sharrem d.o.o., Arsi d.o.o., Kosovski boksiti.

